



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA

Março, 2026

Sumário

0.	Introdução	4
1.	Tipo de Serviço	4
2.	Número da Ordem de Serviço.....	4
3.	Quantidade de Ordens de Manutenção Demandadas e Acumulado de Instalações.....	4
4.	Datas de demanda e execução das Ordens de Serviço.....	6
5.	Identificação dos Logradouros	6
5.1.	Resumo de Bairros Atendidos pela Manutenção/Modernização	6
6.	Quantidade de Componentes Retirados ou Instalados	7
6.1.	Componentes Instalados / Retirados pela Manutenção/Modernização	8
7.	Datas de envio e Aprovação de Projetos	10
8.	Indicação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com interferência no fluxo luminoso por ÁRVORES e programação de execução do serviço de PODA DE ÁRVORE para o trimestre seguinte	10
9.	Informações sobre serviço de PODA DE ÁRVORE realizados no período e histórico de solicitações	10
10.	Evolução das atividades referentes à execução da MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	11
11.	Registro de Boletins de Ocorrência sobre furtos e vandalismo	11
12.	Número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS instalados	11
13.	Evolução das atividades referentes à execução das ações previstas nos PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (PGS), e acompanhamento do SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (SGSA)	11
14.	Portal de Transparência da PPP	11

0. Introdução

Em cumprimento ao item 5.9 do anexo 4 – Caderno de Encargos, página 17, apresentamos o Relatório de Execução de Serviços das atividades realizadas pela STYLUX Concessionária de Iluminação Pública de Teixeira de Freitas SPE no período de 01 a 31 de Março de 2026, em conformidade com as obrigações estabelecidas no contrato de concessão.

Durante o mês em análise, foram executados serviços de manutenção corretiva, bem como ações de modernização e efficientização do parque de iluminação pública, com destaque para a substituição de luminárias obsoletas por tecnologia LED.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL	
DATA:	01/04/2026
RESPONSÁVEL:	Stylux SPE - Teixeira de Freitas
PERÍODO:	01/03/2026 À 31/03/2026
QUANTIDADE DE PONTOS ATENDIDOS:	2228

1. Tipo de Serviço

Durante o período analisado foram realizados dois tipos de serviços, em um total de 2228 pontos atendidos.

- Manutenção / Modernização

2. Número da Ordem de Serviço

O número de cada ordem de serviço encontra-se relacionado no Relatório referente ao mês de Março de 2026, conforme o ANEXO A deste documento.

3. Quantidade de Ordens de Manutenção Demandadas e Acumulado de Instalações

A quantidade de Ordens de Serviço apresentadas a seguir foram obtidas a partir da base do sistema de gestão da Concessionária, sendo o resumo geral demonstrado abaixo. A íntegra da base utilizada para esta análise está disponibilizada no anexo A.



Figura 1 – Ordens de Serviço

Tem-se que o cadastro base do parque de iluminação municipal é composto de aproximadamente 19.487 pontos de iluminação pública, que podem ser modernizados em LED e tornarem-se aptos a receber o sistema de controle por telegestão. Conforme Relatório de Acompanhamento Mensal – Modernização e Eficientização, de Março/2026[1], a contar de Dezembro/2025, foram modernizados e eficientizados 10.687 pontos de iluminação pública, evidenciando a evolução contínua da produtividade nas frentes de execução do contrato. A progressão mensal das atividades encontra-se representada no gráfico, demonstrando o desempenho operacional e o avanço de 54,79 % dos serviços no período analisado:

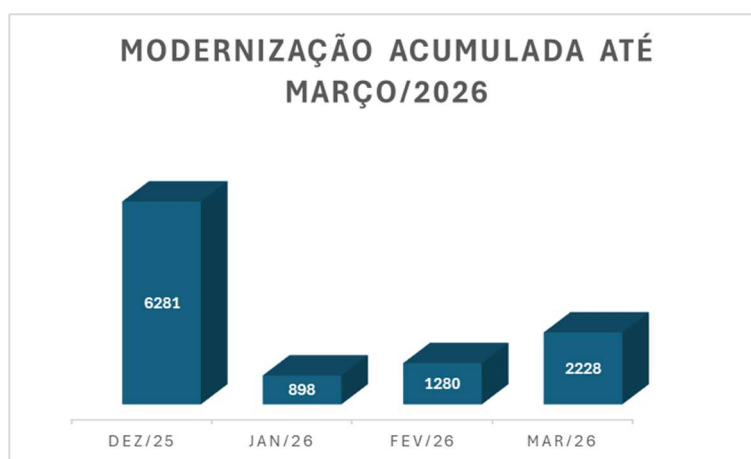


Figura 2 – Evolução da Modernização

Durante o mês, foram demandadas 2.311 Ordens de Serviço, para as equipes, sendo 2.228 atendidas e 83 não atendidas. As 83 ordens de serviço não foram atendidas pelos seguintes motivos: falta

de IP no local, vias fechadas e por conta de obras, falta de rede de alimentação pela Distribuidora de energia (Neoenergia/Coelba) e solicitação de manutenção não comprovada em campo.

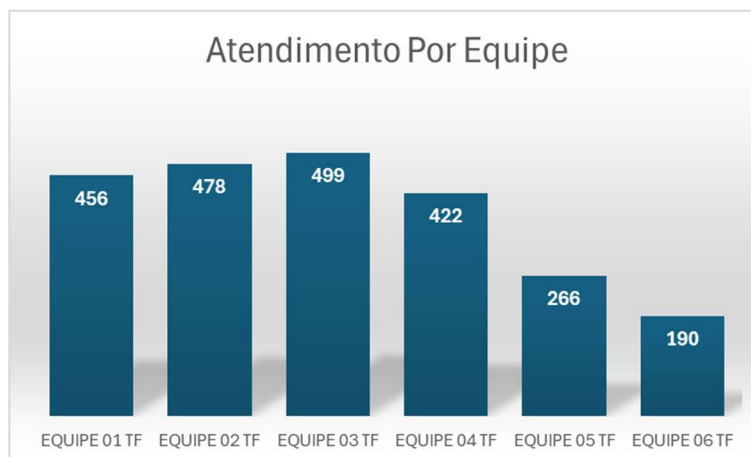


Figura 3 – Atendimentos por equipe

4. **Datas de demanda e execução das Ordens de Serviço**

As datas de demandas e execução das ordens de serviço encontram-se relacionados no Relatório referente ao mês de Março de 2026, conforme ANEXO A deste documento.

5. **Identificação dos Logradouros**

A identificação das vias e dos bairros encontram-se detalhadamente relacionadas no Relatório referente ao mês de Março de 2026, conforme disposto no ANEXO A deste documento.

5.1. **Resumo de Bairros Atendidos pela Manutenção/Modernização**

Segue abaixo, o Resumo de Bairros apresentando o total de pontos atendidos durante o período de referência. Entre serviços de manutenção, foram contemplados 2.228 pontos de iluminação pública, distribuídos entre as diversas regiões do município.

O desempenho e a distribuição desses atendimentos estão representados no gráfico a seguir, que ilustra de forma consolidada a atuação da concessionária em diversos bairros:

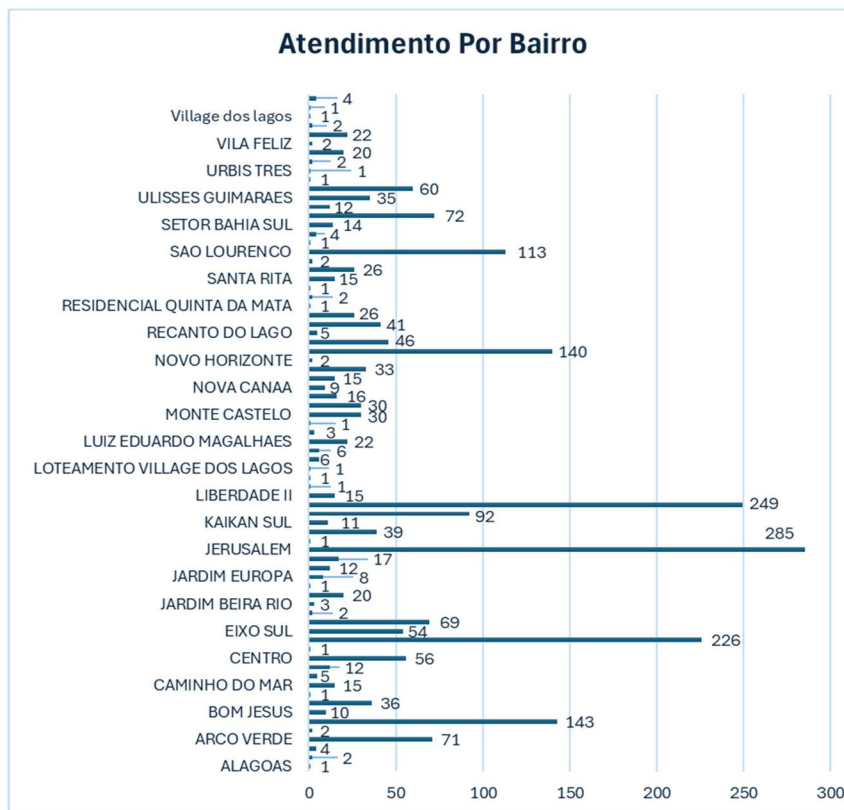


Figura 4 – Atendimentos por bairro

6. Quantidade de Componentes Retirados ou Instalados

6.1. Componentes Instalados / Retirados pela Manutenção/Modernização

Produto	Retirad	Incluíd
LAMPADA VAPOR METALICO 250W	77	0
LUMINARIA TLTF-04	125	0
RELE FOTOELETRICO NA	2149	0
DRIVER LED	13	1259
LED 0030W - 4000K - S411 - STYLUX	35	2002
LUMINARIA LED PADRÃO	27	1893
RELE STYLUX	33	2189
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	1290	0
LUMINARIA TLTF-02	613	0
REATOR EXTERNO 70W	144	0
LUMINARIA TLTF-03	88	0
LUMINARIA TLTF-05	588	0
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	293	0
DRIVE LED	11	425
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	14	0
LAMPADA VAPOR METALICO 70W	13	0
LUMINARIA TLEDTF-03	11	0
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	205	0
LUMINARIA TLTF-01	210	0
LAMPADA LED 0030W – LED INICIAL	11	0
LUMINARIA TLEDTF-09	34	0
LUMINARIA TLTF-10	6	0
LUMINARIA TLEDTF-07	125	0
LUMINARIA TLTF-06	2	0
RELE INEXISTENTE	2	0
REATOR EXTERNO 250W	23	0
LED EXISTENTE 50W	36	0
LED EXISTENTE 30W	36	0
Reator Não informado	21	0
PROJETOR TPLEDTF-04	2	0
LUMINARIA TLTF-12	15	0
REATOR EXTERNO 150W	16	0
LAMPADA LED 30W	21	0
LED EXISTENTE 150W	46	0
LUMINARIA TLEDTF-04	16	0
LUMINARIA TLEDTF-01	11	0
LED EXISTENTE 100W	10	0
REATOR 70W	1	0
LUMINARIA TLEDTF-02	4	0
LAMPADA VAPOR METALICO 150W	6	0
LUMINARIA TLTF-08	2	0
LUMINARIA TLEDTF-05	5	0
REATOR EXTERNO 400W	1	0
LAMPADA LED 50W	3	0
LAMPADA LED 130W	1	0
LED EXISTENTE 200W	1	0
TLEDTF- 12	1	0
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	21	0
LUMINARIA TLTF-11	1	0
LUMINARIA LED 30W (INATIVO)	1	0
PROJETOR TPTF-02	1	0
REATOR 1000W	1	0
LUMINARIA TLTF-07	1	0
LED EXISTENTE 90W	2	0
LED EXISTENTE 60W	1	0
REATOR 150W	1	0

7. Datas de envio e Aprovação de Projetos

Em atenção à solicitação de datas de envio e aprovação de cada projeto (tais como Modernização e Eficientização, Iluminação Especial, Expansão da Rede Municipal de Iluminação Pública, entre outros).

O Plano de Modernização foi enviado no dia 11/03/2026, para avaliação do Verificador Independente e do Poder Concedente. Em 19/03/2026 o Verificador Independente manifestou-se pela aprovação.

8. Indicação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com interferência no fluxo luminoso por ÁRVORES e programação de execução do serviço de PODA DE ÁRVORE para o trimestre seguinte

Em atenção à solicitação de indicação dos pontos de iluminação pública com interferência no fluxo luminoso por árvores, bem como da recomendação de execução de serviços de poda para o trimestre seguinte, informamos que não houve registro/indicação desses pontos no período de referência.

A programação das atividades tem início previsto para após a conclusão da modernização, cujo cronograma ainda será elaborado.

9. Informações sobre serviço de PODA DE ÁRVORE realizados no período e histórico de solicitações

Em atenção à solicitação de informações sobre os serviços de poda de árvore realizados no período, bem como do histórico de solicitações (com status e respectivos motivos de aprovação ou reprovação), informamos que não houve registro de execução de serviços de poda no período de referência.

Da mesma forma, não consta histórico de solicitações de poda cadastradas no período, não havendo, portanto, status de aprovação/reprovação ou justificativas associadas.

10. Evolução das atividades referentes à execução da MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO

Ao longo do mês de janeiro, foram modernizados e eficientizados 2.228 pontos de iluminação pública, evidenciando a evolução contínua da produtividade nas frentes de execução do contrato.

11. Registro de Boletins de Ocorrência sobre furtos e vandalismo

Em atenção à solicitação de registros de Boletins de Ocorrência relacionados a furtos e vandalismo na Rede Municipal de Iluminação Pública, informamos que, durante o período analisado, não foram registrados Boletins de Ocorrência referentes a furto ou vandalismo no sistema de IP do município.

12. Número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS instalados

Em atenção à solicitação referente ao número de Pontos de Iluminação Pública adicionais instalados, informamos que, no período analisado, não houve adição/installação de pontos adicionais de iluminação pública na rede municipal.

13. Evolução das atividades referentes à execução das ações previstas nos PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (PGS), e acompanhamento do SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (SGSA)

Em atenção à evolução das atividades referentes à execução das ações previstas nos Programas de Gestão Socioambiental (PGS) e ao acompanhamento do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA), informamos que, não houve retirada de materiais para descontaminação. Ressaltamos que os materiais permanecem armazenados e disponíveis na base operacional de Concessionária.

14. Portal de Transparência da PPP

link: <https://styluxbrasil.com.br/teixeira-de-freitas/>

ANEXO A

HISTÓRICO DE ACOMPANHAMENTO – SERVIÇOS

MARÇO 2026
