



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS



CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA

Maio , 2026

Sumário

0. Introdução	3
1. Tipos de serviços	3
2. Número da Ordem de Serviço	3
3. Quantidade de Ordens de Manutenção Demandadas	3
4. Datas de demanda e execução das Ordens de Serviço	4
5. Identificação dos Logradouros	5
6. Quantidade de Componentes Retirados ou Instalados.	6
7. Datas de envio e aprovação de cada projeto	6
8. Indicação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com interferência no fluxo luminoso por ÁRVORES e a recomendação de execução do serviço de PODA DE ÁRVORE para o trimestre seguinte	7
9. Informações sobre serviço de PODA DE ÁRVORE realizados no período, bem como o histórico de solicitações	7
10. Evolução das atividades referentes à execução da MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	7
11. Registro de Boletins de Ocorrência nos períodos sobre furtos e vandalismo	8
12. Número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS instalados	8
13. Evolução das atividades referentes à execução das ações previstas nos PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (PGS), e acompanhamento do SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (SGSA).	9
14. Portal de Transparência da PPP	9

0. Introdução

Em cumprimento ao item 5.9 do anexo 4 – Caderno de Encargos, página 17, apresentamos o Relatório de Execução de Serviços das atividades realizadas pela STYLUX Concessionária de Iluminação Pública de Teixeira de Freitas SPE no período de 01 a 31 de Maio de 2026, em conformidade com as obrigações estabelecidas no contrato de concessão.

Durante o mês em análise, foram executados serviços de manutenção corretiva, bem como ações de modernização e efficientização do parque de iluminação pública, com destaque para a substituição de luminárias obsoletas por tecnologia LED.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL	
DATA:	01/06/2026
RESPONSÁVEL:	Stylux SPE - Teixeira de Freitas
PERÍODO:	01/05/2026 Á 31/05/2026
QUANTIDADE DE PONTOS ATENDIDOS :	1643

1. Tipo de Serviço

Durante o período analisado foram realizados dois tipos de serviços, em um total de 1643 pontos atendidos.

- Manutenção / Modernização

2. Número da Ordem de Serviço

O número de cada ordem de serviço encontra-se relacionado no Relatório referente ao mês de Maio de 2026, conforme o “ ANEXO A “ deste documento .

3. Quantidade de Ordens de Manutenção Demandadas e Acumulado de Instalações

As quantidades de Ordens de Serviço apresentadas a seguir foram obtidas a partir da base do sistema de gestão da Concessionária, sendo o resumo geral demonstrado abaixo. A íntegra da base utilizada para esta análise , está disponibilizada no anexo A.



Tabela 01 - Ordens de Serviço

"Tem-se que o cadastro base do parque de iluminação municipal é composto de aproximadamente 19.487 pontos de iluminação pública, que podem ser modernizados em LED e tornarem-se aptos a receber o sistema de controle por telegestão. Conforme Relatório de Acompanhamento Mensal – Modernização e Eficientização, de Maio/2026[1], a contar de Dezembro/2025, foram modernizados e eficientizados 15.867 pontos de iluminação pública, evidenciando a evolução contínua da produtividade nas frentes de execução do contrato. A progressão mensal das atividades encontra-se representada no gráfico, demonstrando o desempenho operacional e o avanço de 81,4 % dos serviços no período analisado:"



Tabela 02 - Evolução da Modernização

Durante o mês, foram demandadas 1669 ordens de Serviço, para as equipes, sendo 1643 atendidas e 26 não atendidas. As 26 ordens de serviço não foram atendidas pelos seguintes motivos: área particular e solicitação de manutenção não comprovada em campo .

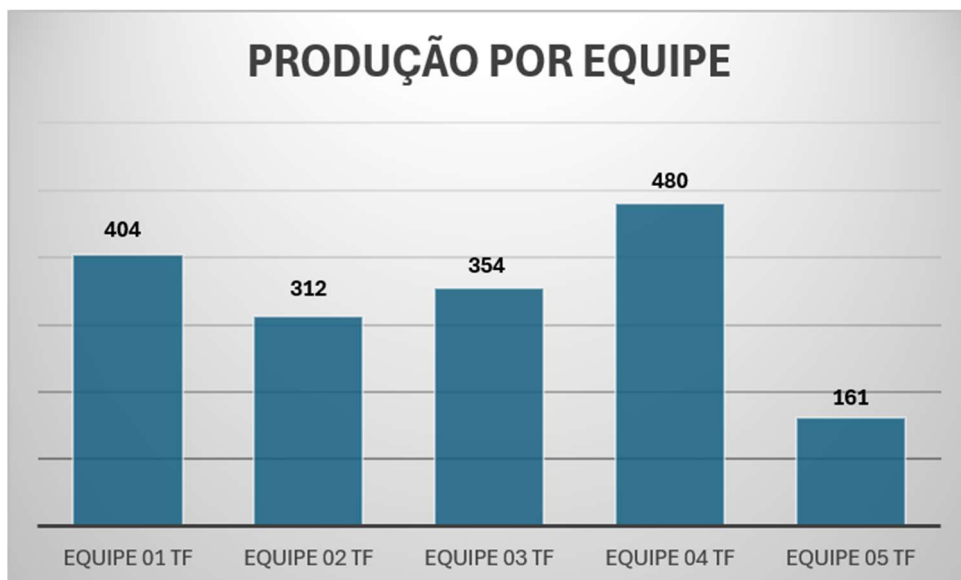


Tabela 03 - Atendimento Por Equipe

4. Datas de demanda e execução das Ordens de Serviço.

As datas de demandas e execução das ordens de serviço encontram-se relacionados no Relatório referente ao mês de Maio de 2026, conforme Anexo "A" deste documento.

5. Identificação dos Logradouros

As identificações das vias e dos bairros encontram-se detalhadamente relacionadas no Relatório referente ao mês de Maio de 2026, conforme disposto no Anexo "A" deste documento.

5.1. Resumo de Bairros Atendidos pela Manutenção/Modernização

Segue, abaixo, o Resumo de Bairros, apresentando o total de pontos atendidos durante o período de referência. Entre serviços de manutenção, foram contemplados 1643 pontos de iluminação pública, distribuídos entre as diversas regiões do município.

O desempenho e a distribuição desses atendimentos estão representados no gráfico a seguir, que ilustra de forma consolidada a atuação da concessionária em cada bairro.

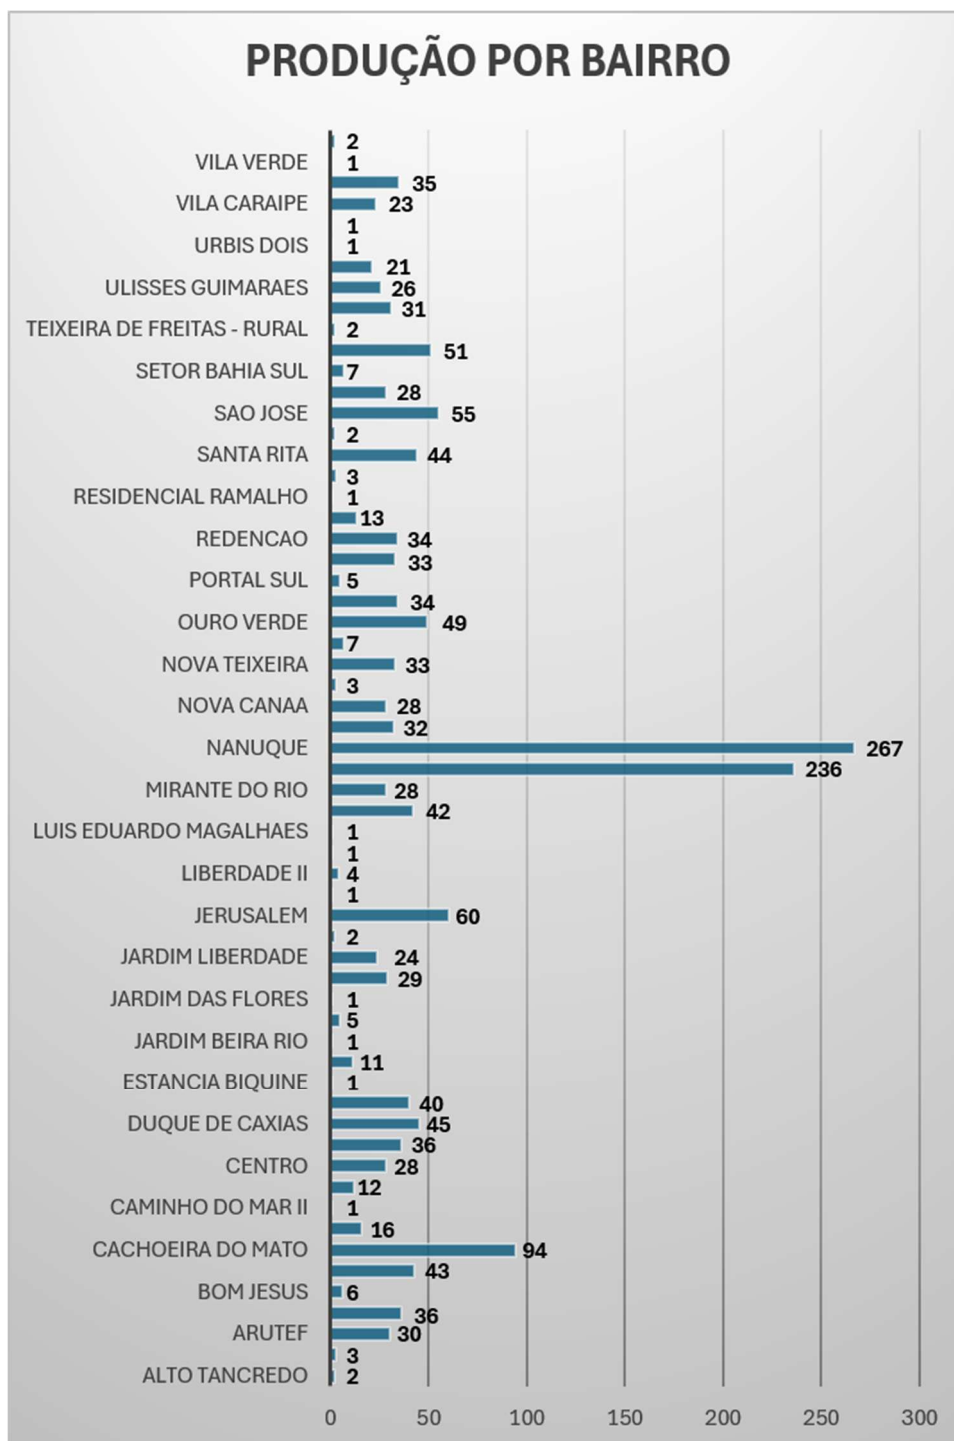


Tabela 04 - Atendimento Por Bairro

6. Quantidade de Componentes Retirados ou Instalados.

6.1. Componentes Instalados / Retirados pela Manutenção/Modernização:



Produto	Retirados	Incluídos
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	735	0
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	322	0
LUMINARIA TLTF-02	329	0
LUMINARIA TLTF-05	317	0
LUMINARIA LED PADRÃO	8	1391
LED 0040W - 4000K - S412 - STREET - STYLUX	0	187
DRIVER LED	6	874
RELE STYLUX	11	766
LED 0030W - 4000K - S411 - STREET - STYLUX	24	1187
RELE FOTOELETRICO NA	679	0
LAMPADA VAPOR METALICO 250W	104	0
LUMINARIA TLTF-04	310	0
FITA ISOLANTE	0	2
BRAÇO PEQUENO - 1,00m x 25mm TBR-03	15	0
LUMINARIA TLTF-01	128	0
BRACO GALVANIZADO 2mx48mm	0	26
CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KR 3 X 1,50mm Preto	0	289,9
DRIVE LED	2	408
CONECTOR PERFURANTE 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5MM-10MM PERFUCON PRO	0	139
LAMPADA VAPOR METALICO 150W	2	0
LUMINARIA TLTF-03	34	0
LUMINARIA TLEDTF-07	94	0
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	100	0
LUMINARIA TLEDTF-09	34	0
LED EXISTENTE 150W	11	0
LUMINARIA TLEDTF-04	11	0
LED 0090W-4000K-S412-STYLUX	3	45
LED EXISTENTE 50W	42	0
LED EXISTENTE 90W	2	0
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	23	0
LUMINARIA TLTF-11	7	0
LUMINARIA TLTF-12	9	0
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	21	0
LUMINARIA TLEDTF-02	1	0
BRAÇO MEDIO 2,40m x 33mm TBR-05	1	0
LUMINARIA TLTF-13	10	0
LAMPADA VAPOR METALICO 70W	9	0
LAMPADA LED 50W	0	0
LUMINARIA TLEDTF-05	3	0
LUMINARIA TLEDTF-01	52	0
BRAÇO MEDIO 2,50m x 48mm TBR-06	4	0
LUMINARIA TLEDTF-03	2	0
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	2	0
REATOR 1000W	1	0
LUMINARIA LED 30W (INATIVO)	2	0
LAMPADA LED 0030W – LED INICIAL	2	0
REATOR 150W	1	0
RELE INEXISTENTE	70	0
LUMINARIA TLTF-07	27	0
TLEDTF-12	1	0
LAMPADA LED 0040W – LED INICIAL	1	0
LED EXISTENTE 30W	2	0
LED EXISTENTE 40W	7	0
LUMINARIA TLTF-08	4	0

7. Datas de envio e Aprovação de cada Projeto

Em atenção à solicitação de datas de envio e aprovação de cada projeto (tais como Modernização e Eficientização, Iluminação Especial, Expansão da Rede Municipal de Iluminação Pública, entre outros).

O Plano de Modernização foi enviado no dia 11/03/2026, para avaliação do Verificador Independente e do Poder Concedente, tendo sido aprovado pelo Verificar Independente no dia 19/03/2026, e na mesma data foi apresentado ao Poder Concedente.

8. Indicação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com interferência no fluxo luminoso por ÁRVORES e a recomendação de execução do serviço de PODA DE ÁRVORE para o trimestre seguinte

Em atenção à solicitação de indicação dos pontos de iluminação pública com interferência no fluxo luminoso por árvores, bem como da recomendação de execução de serviços de poda para o trimestre seguinte, informamos que não houve registro/indicação desses pontos no período de referência.

A programação das atividades tem início previsto para após a conclusão da modernização, cujo cronograma ainda será elaborado.

9. Informações sobre serviço de PODA DE ÁRVORE realizados no período, bem como o histórico de solicitações

Em atenção à solicitação de informações sobre os serviços de poda de árvore realizados no período, bem como do histórico de solicitações (com status e respectivos motivos de aprovação ou reprovação), informamos que não houve registro de execução de serviços de poda no período de referência.

Da mesma forma, não consta histórico de solicitações de poda cadastradas no período, não havendo, portanto, status de aprovação/reprovação ou justificativas associadas.

10. Evolução das atividades referentes à execução da MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO

Ao longo do mês de Maio, foram modernizados e eficientizados 1643 pontos de iluminação pública, evidenciando a evolução contínua da produtividade nas frentes de execução do contrato.

11. Registro de Boletins de Ocorrência nos períodos sobre furtos e vandalismo

Em atenção à solicitação de registros de Boletins de Ocorrência relacionados a furtos e vandalismo na Rede Municipal de Iluminação Pública, informamos que, durante o período analisado, não foram registrados Boletins de Ocorrência referentes a furto ou vandalismo elétrico no município.

12. Número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS instalados

Em atenção à solicitação referente ao número de Pontos de Iluminação Pública adicionais instalados, informamos que, no período analisado, não houve adição/installação de pontos adicionais de iluminação pública na rede municipal.

13. Evolução das atividades referentes à execução das ações previstas nos PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (PGS), e acompanhamento do SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (SGSA).

Em atenção ao questionamento sobre a evolução das atividades referentes à execução das ações previstas nos Programas de Gestão Socioambiental (PGS) e ao acompanhamento do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA), informamos que, não houve retirada de materiais para descontaminação. Ressaltamos que os materiais permanecem armazenados e disponíveis na base operacional de Concessionária.]

14. Portal de Transparência da PPP

link: <https://styluxbrasil.com.br/teixeira-de-freitas/>

ANEXO “A”

HISTÓRICO DE ACOMPANHAMENTO – SERVIÇOS

MAIO/2026
